

CABLEBÚS L2



CONSTITUCIÓN DE 1917- SANTA MARTA




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CABLEBÚS

TRAZO GENERAL

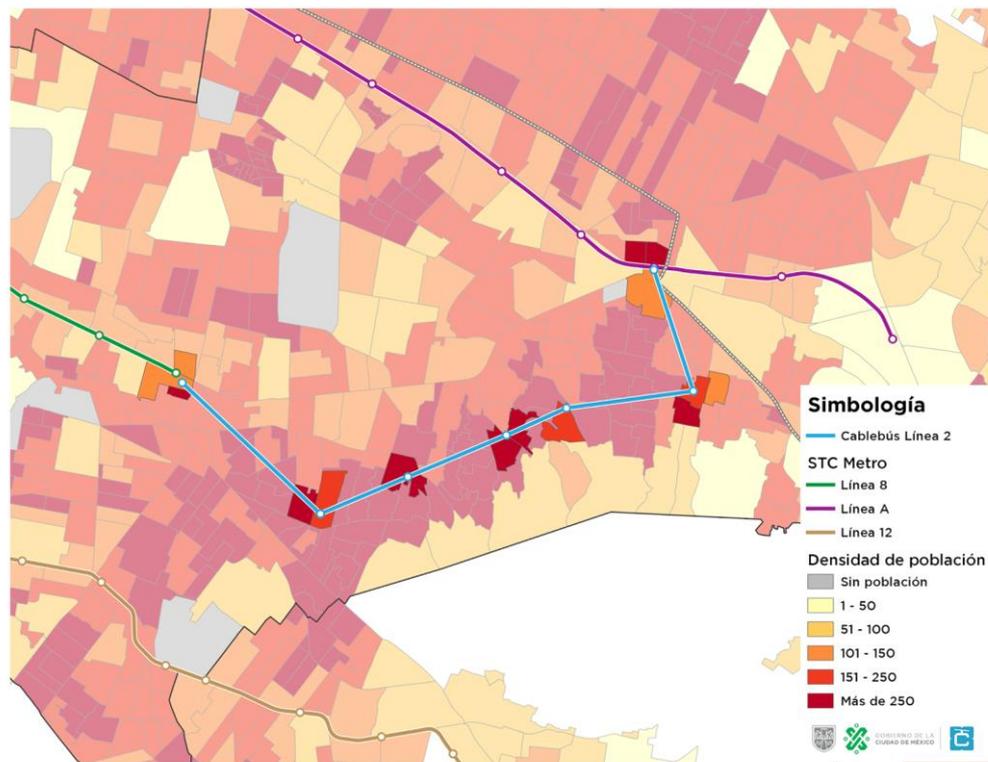

La línea 2 del Cablebús conecta zonas de alta marginación y **densidad poblacional** en Iztapalapa

Densidad poblacional en Iztapalapa, INEGI 2010



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



CABLEBÚS

TRAZO GENERAL



La línea 2 del Cablebús conecta zonas de **alta marginación** y densidad poblacional en Iztapalapa

Grado de Marginación Urbana en Iztapalapa, CONAPO 2010



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CABLEBÚS

DATOS GENERALES

Inversión \$3,168 mdp | Población beneficiada 168,181



Reducción de traslado a **40 minutos** (de 73 min.)



Ahorro mensual por persona **518 pesos**



Empleos creados **1,200-1,500**



Transporte **limpio, seguro y eficiente**



Ubicación **Iztapalapa**



Conexión de sistemas de transporte
Metro L8 y LA RTP Trolebús elevado



Longitud del trazo **10.6 km con 7 estaciones**



Capacidad máxima por día **200 mil pasajeros**



308 Cabinas **10 personas sentadas**



Rescate de espacios públicos



Internet gratuito



59 Torres



Velocidad **6 m/s (21.6 km/h)**



Frecuencia **10.3 segundos entre cabinas**



Cámaras de **vigilancia**



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



CABLEBÚS

ESTACIONES Y ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS

1 CONSTITUCIÓN DE 1917



2 QUETZACÓATL



Mercado

3 BUENAVISTA



Cancha de fútbol



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CABLEBÚS

ESTACIONES Y ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS

4 MINAS



5 LOMAS DE LA ESTANCIA



Jardín

6 SAN MIGUEL TEOTONGO



Integración con parque de Alcaldía

7 SANTA MARTA




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CABLEBÚS

CABINAS

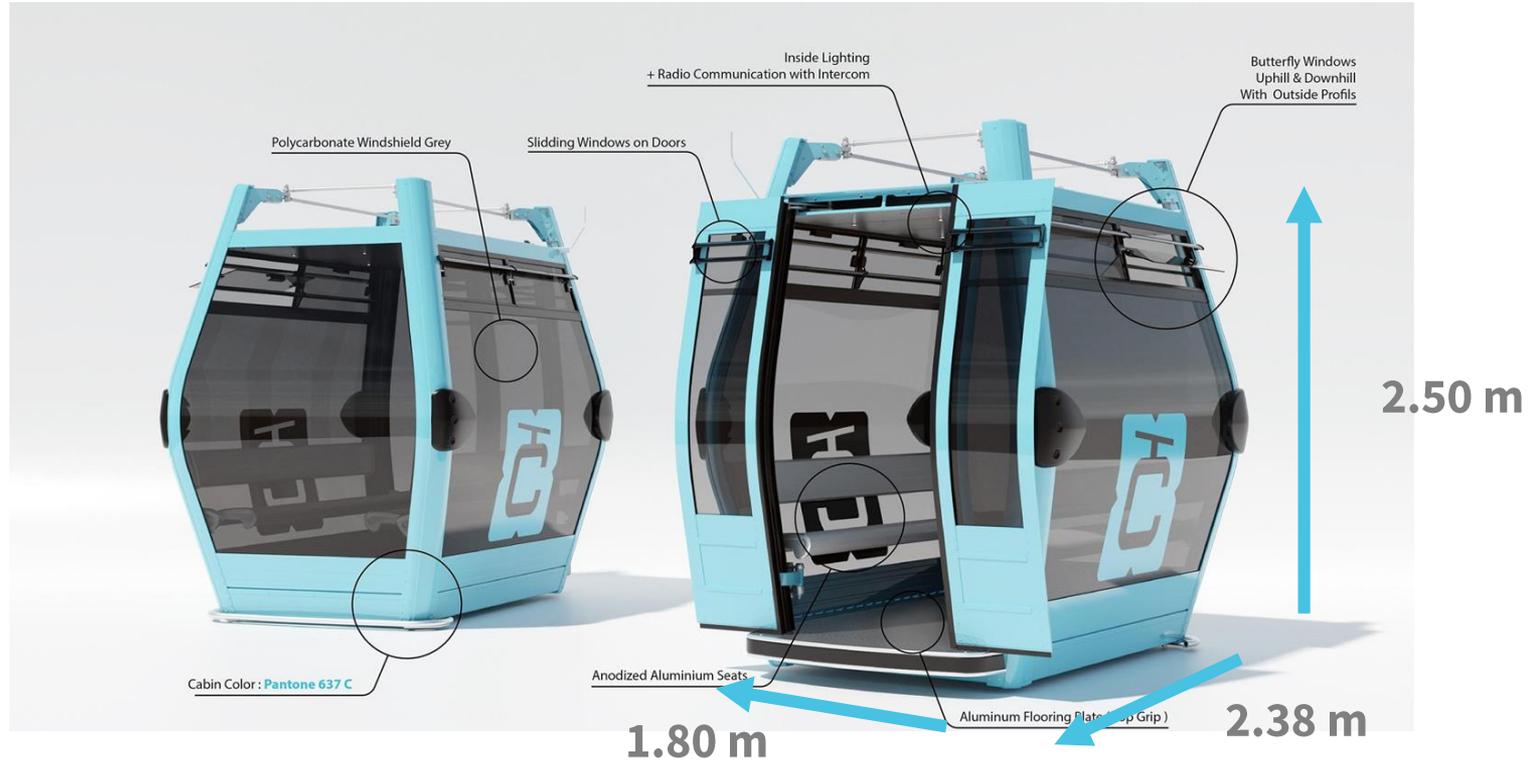

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CABLEBÚS

AVANCES GENERALES DE ACTIVIDADES



95%

Mecánica de
suelos en
estaciones

27%

Mecánica de
suelos en postes



28%

Fabricación del
sistema
electromecánico



- Anclas de la cimentación de postes
- Poleas matrices y de retorno
- Balancines de postes de líneas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CABLEBÚS

PROGRAMA DE OBRA

Proyecto integral 18.81% Avance

	DURACIÓN	INICIO	FIN	TRI 3, 2019		TRI 4, 2019			TRI 1, 2020				TRI 2, 2020				TRI 3, 2020			TRI 4, 2020				TRI 1, 2021			TRI 2, 2021				TRI 3, 2021			TRI 4, 2021				TRI 1, 2022			TRI 2, 2022				
				AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB
TOTAL	843	30/09/2019	30/04/2022	[Bar chart showing cumulative progress across all activities]																																									
PROYECTO EJECUTIVO	82	30/09/2019	30/12/2019	[Bar chart showing progress for project execution]																																									
LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA	82	30/09/2019	31/01/2020	[Bar chart showing progress for right-of-way release]																																									
3. ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y URBANO	137	30/09/2019	29/02/2020	[Bar chart showing progress for environmental and urban impact studies]																																									
SISTEMA ELECTROMECAÁNICO	489	01/10/2019	31/12/2020	[Bar chart showing progress for electromechanical system]																																									
OBRA CIVIL CIMENTACIÓN DE COLUMNAS Y TORRES.	244	01/01/2020	30/09/2020	[Bar chart showing progress for civil works: columns and towers]																																									
OBRA CIVIL ESTACIONES	406	01/01/2020	31/12/2020	[Bar chart showing progress for civil works: stations]																																									
SISTEMA ELÉCTRICO	460	01/10/2019	31/12/2020	[Bar chart showing progress for electrical system]																																									
OBRA INDUCIDA	326	01/11/2019	30/10/2020	[Bar chart showing progress for induced works]																																									
CERTIFICACIÓN	135	01/12/2020	30/04/2021	[Bar chart showing progress for certification]																																									
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CAPACITACIÓN	352	01/04/2021	30/04/2022	[Bar chart showing progress for technology transfer and training]																																									



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



CABLEBÚS

CABLEBÚS L2

CONSTITUCIÓN DE 1917- SANTA MARTA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CABLEBÚS
